

# Projektmanagement & & Controlling

Controlling





## Die Themen

- Einblick :: Erstellen Sie ein Kurzprofil ihres Betriebes
- Präsentation:: Stellen Sie Ihr Kurzprofil vor
- DragDrop :: Finden Sie's raus
- Wissen:: Das "7 + 4 Prozessmodell"
- Wissen:: Alles ist rund Der Management-Zyklus



# **Einblick in Ihren Betrieb:**

Erstellen Sie ein Kurzprofil zu Ihrem Betrieb





Ihr Name	Ihr Ausbildungsbetrieb (bitte auch den Ort angeben)	
Beschreiben Sie die wichtigsten Geschäftsbereiche Ihres Hauses		
((Anders gefragt: Mit welchen Produkten oder Services verdient Ihr Ausbildungsbetrieb sein Geld?))		
Beschreiben Sie Projekte und deren besonderen Kenr	zeichen, die Sie in Ihrem Haus kennengelernt haben	


((Anders gefragt: Waren Sie schon ein einem Projekt beteiligt oder kennen Sie eines in Ihrem Haus?))

# Projektphasen im Überblick:

Finden Sie's raus: Die 7 Phasen der Glückseligkeit ...



# Phasen eines Projektes:: Prozessmodell (7 + 4-Modell)

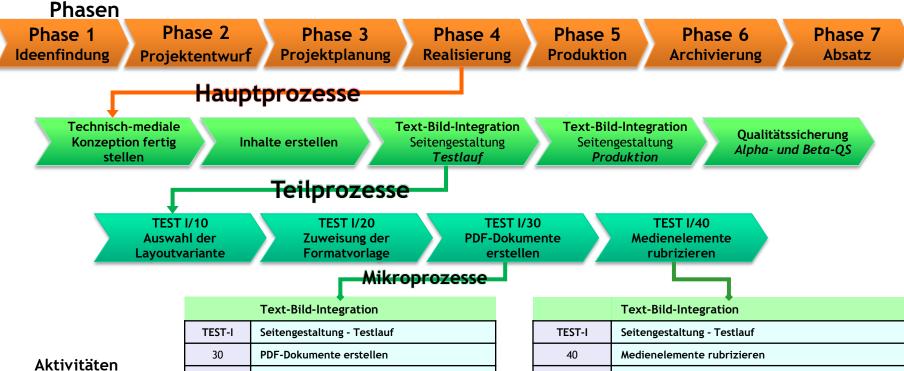


und Aufgaben

Verantwortungsverteilung

l ext-Bild-integration	
TEST-I	Seitengestaltung - Testlauf
30	PDF-Dokumente erstellen
Was?	Für die Derivate der Word-Dokumente (Druck, Ansicht, Miniatur) muss im ersten Schritt ein PDF-Dokument erstellt werden
Wer?	Medien-Designer
Mit wem?	Print- und/oder Multimedia-Redakteur
Art	Kann-Abstimmung
Standard	Im Backoffice des LC-MG wird das Weißbuch "PDF-Erstellung" geführt und aktualisiert
Partner	Herr Müller

	Text-Bild-Integration
TEST-I	Seitengestaltung - Testlauf
40	Medienelemente rubrizieren
Was?	Für die Rubrikenansicht der Textbausteine sowie der Grafiken des linken Lehrerbandseite müssen die Daten vor der weiteren Aufbereitung rubriziert werden
Wer?	Redakteur und Assistent
Mit wem?	Multimedia-Redakteur
Art	Abstimmungspflichtig
Standard	In der Redaktion wird die gültige Rubrizierungsliste geführt und aktualisiert. Für die Rubrizierung der Daten steht ein Rubrikenerfassungstool zur Verfügung
Partner	Frau Schmidt

# Alles ist rund — der Management-Zyklus

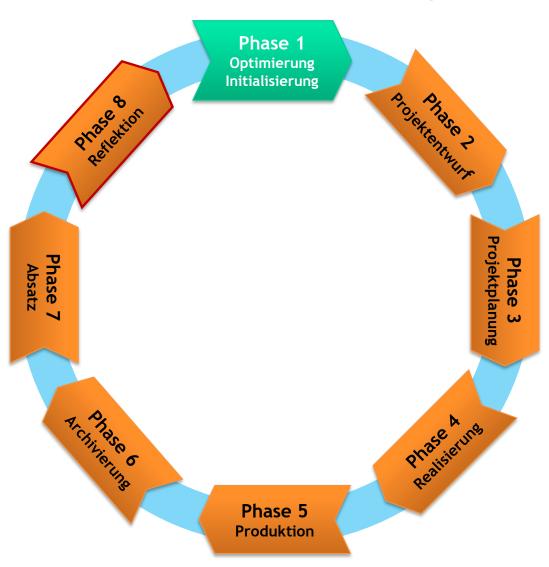

## Das Ziel eines jeden Projektes:

Das Ziel eines jeden Projektes (bzw. Projektteams) ist es, den Projektstatus hinter sich zu lassen und in die Regelproduktion zu gelangen.

Nach Ende des ersten Projektdurchlaufs erfolgt eine **Reflektion** (Überprüfung, Kontrolle) der verschiedenen Projektphasen und eine daran anschließende **Optimierung der Prozesse**.

Vereinfacht lässt sich der Management-Zyklus als 4-Phasen-Modell darstellen:





Verantwortlich im Sinne des Presserechtes für diese PowerPoint-Präsentation ist **Toni Cramer**. Die Präsentation begleitet den Kurs "**Projektmanagement & Controlling**" an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule. Es handelt es sich um eine nicht kommerzielle, für Schulungs- und Bildungszwecke, eingerichtete Präsentation.

#### Meine Adressdaten sind:



Toni Cramer Irisweg 36 71672 Marbach

Fon: 07144-861177 Fax: 07144-858350

Mail: Softonic@aol.com Web: www.projectonic.de

www.sciencetonic.de

### Medienquellen

Alle Quellenhinweise zu grafischen Darstellungen und Texten werden auf den jeweiligen Folien selbst wiedergegeben.

Andere grafische Darstellungen, die nicht gesondert gekennzeichnet sind entstammen den Sammlungen von Hemera Photoobjects 50.000 oder der Serif Image Collection.

#### Schutzrechtsverletzungen

Falls Sie vermuten, dass von dieser Website bzw. PowerPoint-Folie aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie mir das bitte umgehend per Post, Mail oder Telefon mit. Es wird sofort Abhilfe geschaffen.

Copyright: MicroToniC, 2020 :: Alle Rechte vorbehalten

Die PowerPoint-Datei und ihre Teile (Folien und grafische Darstellungen) sind urheberrechtlich geschützt. Das gleiche gilt für alle Texte der Folien. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des jeweiligen Rechtegebers bzw. Autors.

**Hinweis zu §52 a UrhG:** Weder die PowerPoint-Dateien noch ihre Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt werden.

Dies gilt auch für Intranets von Firmen, Schulen, Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen.
